



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

CONTRATO DE CONCESSÃO

Concessionária
de Iluminação Pública



conecta
Aracaju / SE

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relatório Gerencial Mensal Período: Fevereiro/2024

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

INTRODUÇÃO

É com satisfação que apresentamos o relatório referente ao período de 01/02/2024 à 29/02/2024, que abrange os acontecimentos mais significativos do Centro de Controle Operacional (CCO). Este documento destaca os atendimentos realizados durante o período, fornecendo insights sobre o volume de demandas atendidas por equipe, os prazos de execução, bem como o número de ocorrências rejeitadas. Além disso, são detalhadas as composições das equipes técnicas envolvidas em atividades de manutenção e modernização, junto com os resultados obtidos, incluindo a quantidade de luminárias e lâmpadas modernizadas, os sistemas de iluminação especial implementados e o progresso alcançado na telegestão. Este relatório visa oferecer uma visão abrangente das operações realizadas pelo CCO, proporcionando uma base sólida para análises e tomadas de decisão futuras.



SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

1 - ATENDIMENTOS MANUTENÇÃO

1.1 Status Atendimentos

Atendido	1.705
Total	1.705

1.2 Por origem de ocorrência

App	68
Call Center	376
Internet	28
Prefeitura	-
Ronda própria	1.233
Total	1.705

1.3 Tipo Ocorrência

Atualização de Plaqueta	483	28,33%
Avaliação Ponto Escuro	2	0,12%
Avaliação Pós Modernização	0	0,00%
Braço Deteriorado	0	0,00%
Braço Quebrado	2	0,12%
Falta Luminária (existente)	0	0,00%
Falta Modernizar	2	0,12%
Implantar Poste	0	0,00%
Instalar braço/luminária	8	0,47%
instalar Plaqueta	191	11,20%
Instalar lum. Esquina	0	0,00%
Instalar telegestão	0	0,00%
Lâmp. Acende e Apaga	281	16,48%
Lâmp. Acende e Apaga 16mts	8	0,47%
Lâmp. Acesa durante dia	15	0,88%
Lâmp. acesa durante dia 16mts	0	0,00%
Lâmp. Apagada	662	38,83%
Lâmp. apagada 16mts	16	0,94%
Lâmp. Oscilando	0	0,00%
Luminária Quebrada	1	0,06%
Luminária Virada	0	0,00%
Poste Abalroado	0	0,00%
Poste Dando Choque	0	0,00%
Poste Deteriorado	1	0,06%
Remoção IP	3	0,18%
Retrabalho	0	0,00%
Risco de Acidente	0	0,00%
Substituir Quadro de Comando	0	0,00%
Troca de Potência	1	0,06%
Verificar Comando	9	0,53%
Vistoria	20	1,17%
Total	1.705	100%



SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

1.4 Por equipe

Equipe - 01	365
Equipe - 02	187
Equipe - 03	268
Equipe - 04	215
Equipe - 21	57
Ronda 01	310
Ronda 02	302
CCO	1
Total	1.705

1.5 Por prazo

Dentro do Prazo	1.638	96,07%
Fora do Prazo	67	3,93%
Total	1.705	100%



SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

2 - ATENDIMENTOS MODERNIZAÇÃO/SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.1 Status Atendimentos

Mod: Atendido	9
Total	9

2.2 Por equipe


Equipe - 01	1
Equipe - 02	-
Equipe - 03	1
Equipe - 04	3
Equipe - 21	4
Total	9




SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

3 - Gráficos

Por Origem de Ocorrência Manutenção

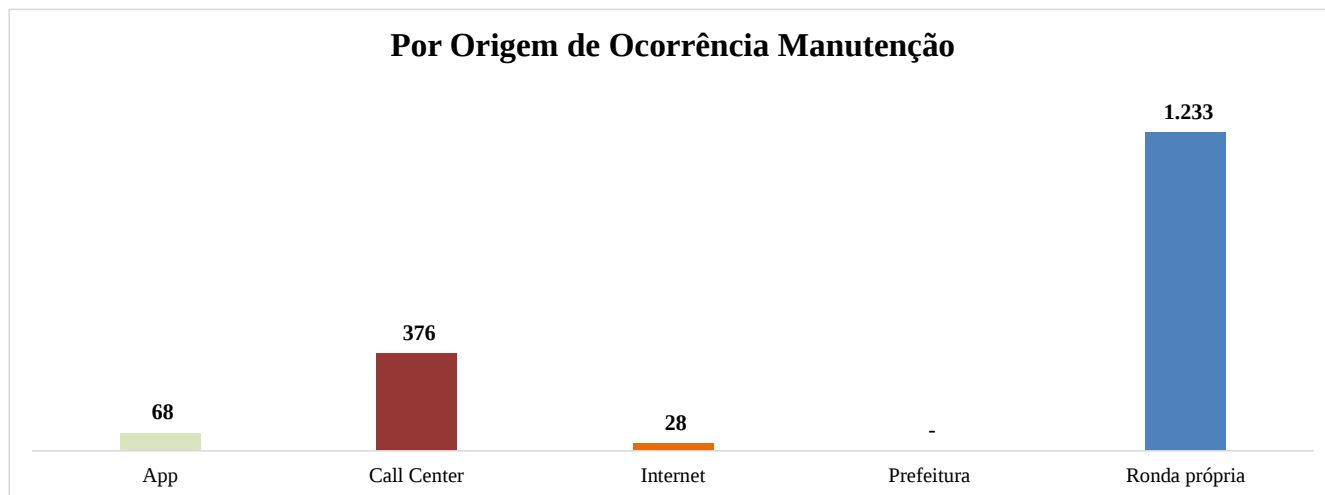


Tipo Ocorrência

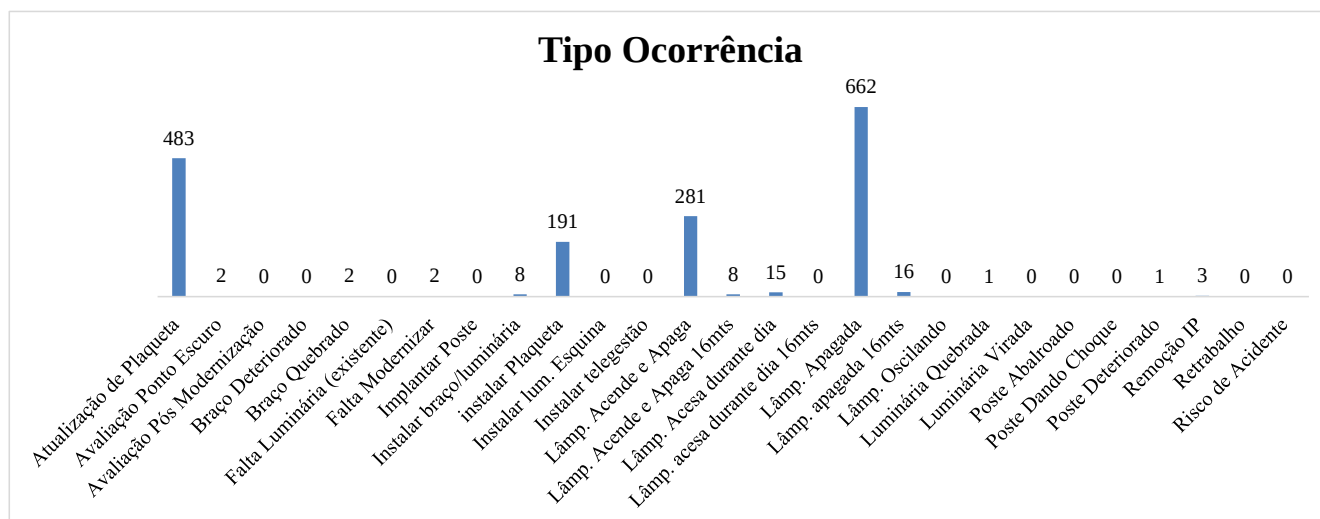




SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Atendimentos Por Equipe Manutenção

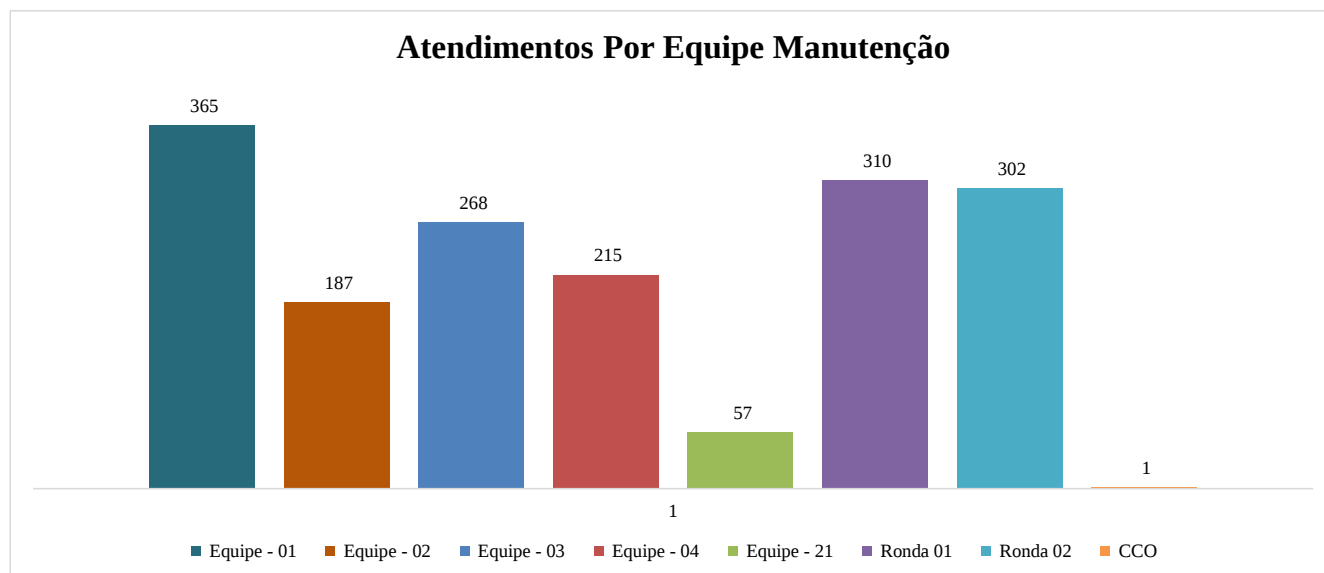

Prazo Manutenção

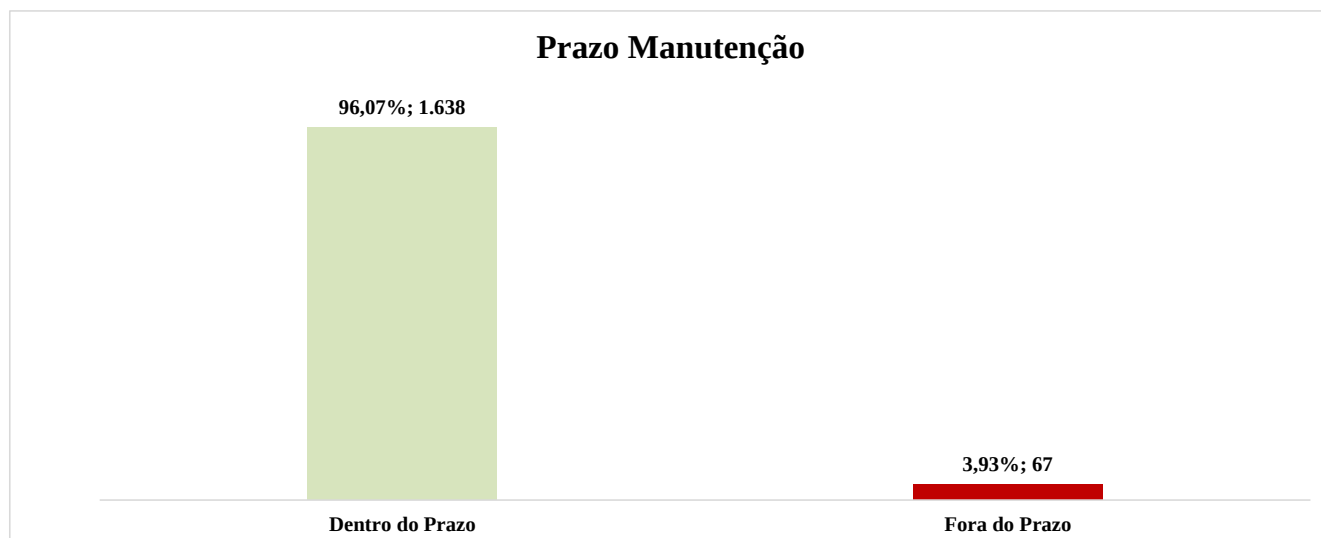



SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS - 2024





SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

4. Estrutura operacional

4.1 Equipe manutenção

Eletricistas	8
Administrativo	1
Coordenador Operacional	1
Total	10

4.2 Equipe Obra

Eletricistas	1
Ajudante Eletricista	1
Pedreiro	1
Motorista	1
Total	4

4.3 Frota de veículos

Veículo leve	1
Veículo Cesto Aéreo	2
Motocicletas	2
Total	5

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

5. Modernização/ Iluminação especial/ Telegestão

5.1 Modernização

Item	Locais	QNT
1	13 DE JULHO	999
2	17 DE MARÇO	1309
3	18 DO FORTE	1380
4	AEROPORTO	1474
5	AMERICA	963
6	AREIA BRANCA	1036
7	ARUANA	3343
8	ATALAIA	2493
9	BUGIO	1172
10	CAPUCHO	562
11	CENTRO	2016
12	CIDADE NOVA	613
13	CIRURGIA	408
14	COROA DO MEIO	3371
15	DOM LUCIANO	627
16	FAROLÂNDIA	3114
17	GAMELEIRA	896
18	GETÚLIO VARGAS	622
19	GRAGERU	1323
20	INACIO BARBOSA	1856
21	INDUSTRIAL	1651
22	JABOTIANA	2080
23	JAPÃOZINHO	479
24	JARDIM CENTENÁRIO	644
25	JARDINS	1656
26	JOSE CONRADO DE ARAUJO	818
27	LAMARÃO	493
28	LUZIA	1551
29	MARIVAN	813
30	MATAÔA	805
31	MOSQUEIRO	1693
32	NOVO PARAISO	849
33	OLARIA	1025
34	PALESTINA	240
35	PEREIRA LOBO	412
36	PONTO NOVO	1303
37	PORTO DANTAS	1432
38	ROBALO	842
39	SALGADO FILHO	562
40	SANTA MARIA	2033
41	SANTO ANTÔNIO	963
42	SANTOS DUMONT	1475
43	SÃO CONRADO	1596
44	SÃO JOSÉ	904
45	SÃO JOSE DOS NAUFRAGOS	1270
46	SIQUEIRA CAMPOS	1145
47	SOLEDADE	938
48	SUISSA	819
TOTAL		60.068

Percentual de Modernização

100,000%

Percentual de Eficientização

Clinicial 12.865.523,40


Cltotal 3.675.182,00

71,43%




SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Lâmpadas Modernizadas

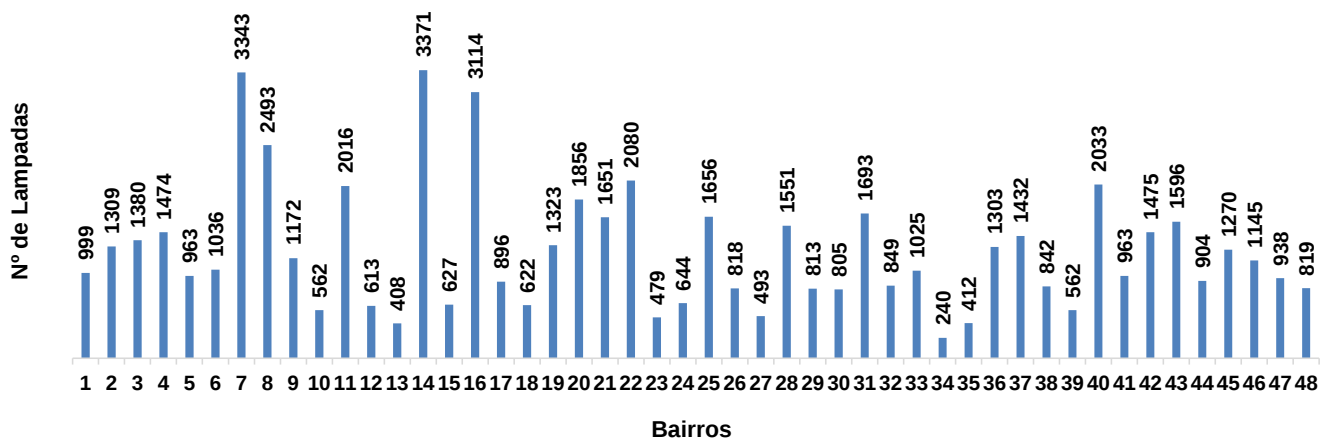

MODERNIZAÇÃO

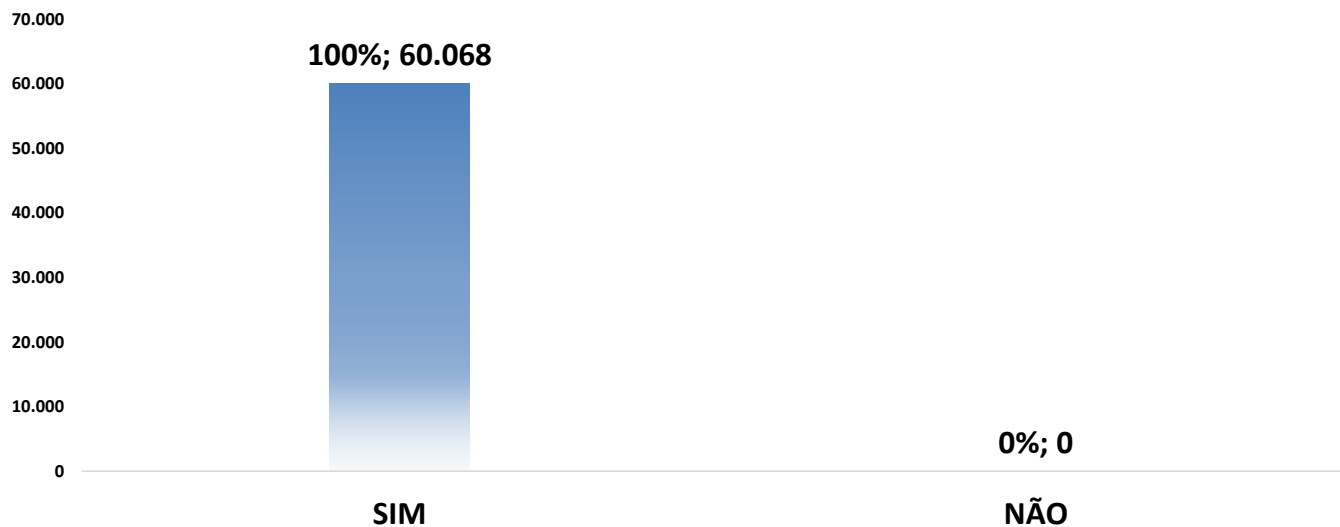



SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

5.2 Iluminação especial

Referente a iluminação especial, foram elaborados todos os projetos executivos, referente ao marco I e II, modernizamos todos os pontos existentes referente aos projetos especiais:

Item	Local	Projeto	Moderniza ção	Execução Iluminação especial
MARCO I				
1	Colina do Santo Antonio	100%	100%	100%
2	Monumento Formadores da Nação	100%	100%	100%
3	Mundo Maravilhoso da Criança	100%	100%	100%
4	Oceanário	100%	100%	100%
5	Arco da Atalaia	100%	100%	100%
6	Centro Cultural	100%	100%	100%
MARCO II				
7	Igreja dos Capuchinhos	100%	100%	100%
8	Orlinda do Bairro Industrial	100%	100%	100%
9	Ponte do Imperador	100%	100%	100%
10	Ponte Godofredo Diniz	100%	100%	100%
11	Praça dos Mercados	100%	100%	100%
MARCO III				
12	Farol da Unit	100%	100%	0%
13	Catedral Metropolitana	100%	100%	60%




SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

5.3 Telegestão

Concluimos as cotações e escolha de tecnologia para conectividade entre as luminárias Led e o Software de Gerenciamento que usaremos para implantar a Telegestão, considerando as características da infraestrutura de Aracaju. Posteriormente apresentaremos o cronograma com os pontos que receberão a telegestão.

- Previsão de chegada dos materiais 10/08/2022;
- Treinamento de forma presencial (em Aracaju) entre os dias 08 e 10/08/2022;
- Previsão do início da instalação dos equipamentos logo após o treinamento;
- Previsão do término da instalação dos equipamentos 15/09/2022;
- Término da instalação dos equipamentos 31/08/2022;

Previsto (Marco I)	3.590	100%
Instalado	3.644	102%
Previsto (Marco II)	2.810	100%
Instalado	756	27%

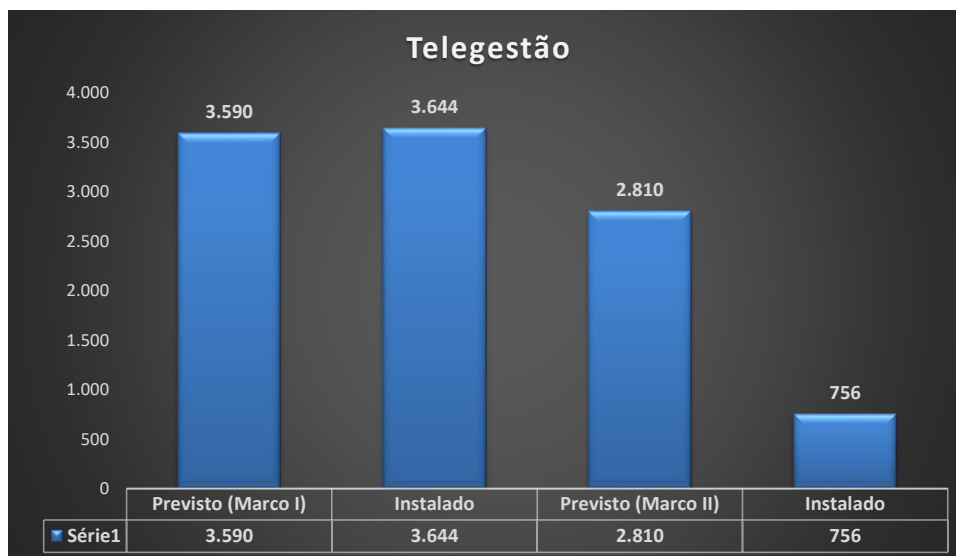



SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

5.3 Banco de Crédito

	Ínicio do Período (t)	Saldo Anterior (Sat)	Créditos adicionados no Período (CA _t)	Créditos consumidos no Período (CC _t)	Saldo para o próximo Período (SF _t)	Data
1	Início Fase II	0	739	739	0	09/11/2021
2	12 meses após período anterior	0	739	724,11	14,89	09/11/2022
3	12 meses após período anterior	14,89	739		753,89	09/11/2023

Obs.:As Informações foram extraídas do relatório full, e ainda estão em processo de análise.
