



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

CONTRATO DE CONCESSÃO

Concessionária
de Iluminação Pública

 **conecta**
Aracaju / SE

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relatório Gerencial Mensal Período: Março/2024

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

INTRODUÇÃO

É com satisfação que apresentamos o relatório referente ao período de 01/03/2024 à 31/03/2024, que abrange os acontecimentos mais significativos do Centro de Controle Operacional (CCO). Este documento destaca os atendimentos realizados durante o período, fornecendo insights sobre o volume de demandas atendidas por equipe, os prazos de execução, bem como o número de ocorrências rejeitadas. Além disso, são detalhadas as composições das equipes técnicas envolvidas em atividades de manutenção e modernização, junto com os resultados obtidos, incluindo a quantidade de luminárias e lâmpadas modernizadas, os sistemas de iluminação especial implementados e o progresso alcançado na telegestão. Este relatório visa oferecer uma visão abrangente das operações realizadas pelo CCO, proporcionando uma base sólida para análises e tomadas de decisão futuras.

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

1 - ATENDIMENTOS MANUTENÇÃO

1.1 Status Atendimentos

Atendido	2.119
Total	2.119

1.2 Por origem de ocorrência

App	77
Call Center	424
Internet	42
Prefeitura	-
Ronda própria	1.576
Total	2.119

1.3 Tipo Ocorrência

Atualização de Plaqueta	316	14,91%
Avaliação Ponto Escuro	0	0,00%
Avaliação Pós Modernização	0	0,00%
Braço Deteriorado	2	0,09%
Braço Quebrado	3	0,14%
Falta Luminária (existente)	6	0,28%
Falta Modernizar	1	0,05%
Implantar Poste	2	0,09%
Instalar braço/luminária	10	0,47%
instalar Plaqueta	453	21,38%
Instalar lum. Esquina	0	0,00%
Instalar telegestão	0	0,00%
Lâmp. Acende e Apaga	329	15,53%
Lâmp. Acende e Apaga 16mts	5	0,24%
Lâmp. Acesa durante dia	27	1,27%
Lâmp. acesa durante dia 16mts	10	0,47%
Lâmp. Apagada	802	37,85%
Lâmp. apagada 16mts	27	1,27%
Lâmp. Oscilando	0	0,00%
Luminária Quebrada	0	0,00%
Luminária Virada	0	0,00%
Poste Abalroado	3	0,14%
Poste Dando Choque	0	0,00%
Poste Deteriorado	2	0,09%
Remoção IP	2	0,09%
Retrabalho	0	0,00%
Risco de Acidente	2	0,09%
Substituir Quadro de Comando	0	0,00%
Troca de Potência	33	1,56%
Verificar Comando	10	0,47%
Vistoria	19	0,90%
Vistoria Telegestão	55	2,60%
Total	2.119	100%



SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

1.4 Por equipe

Equipe - 01	383
Equipe - 02	327
Equipe - 03	290
Equipe - 04	312
Equipe - 21	117
Ronda 01	197
Ronda 02	243
CCO	250
Total	2.119

1.5 Por prazo

Dentro do Prazo	2.013	95,00%
Fora do Prazo	106	5,00%
Total	2.119	100%



SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

2 - ATENDIMENTOS MODERNIZAÇÃO/SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.1 Status Atendimentos

Mod: Atendido	6
Total	6

2.2 Por equipe


Equipe - 01	-
Equipe - 02	5
Equipe - 03	-
Equipe - 04	-
Equipe - 21	1
Total	6




SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

3 - Gráficos

Por Origem de Ocorrência Manutenção

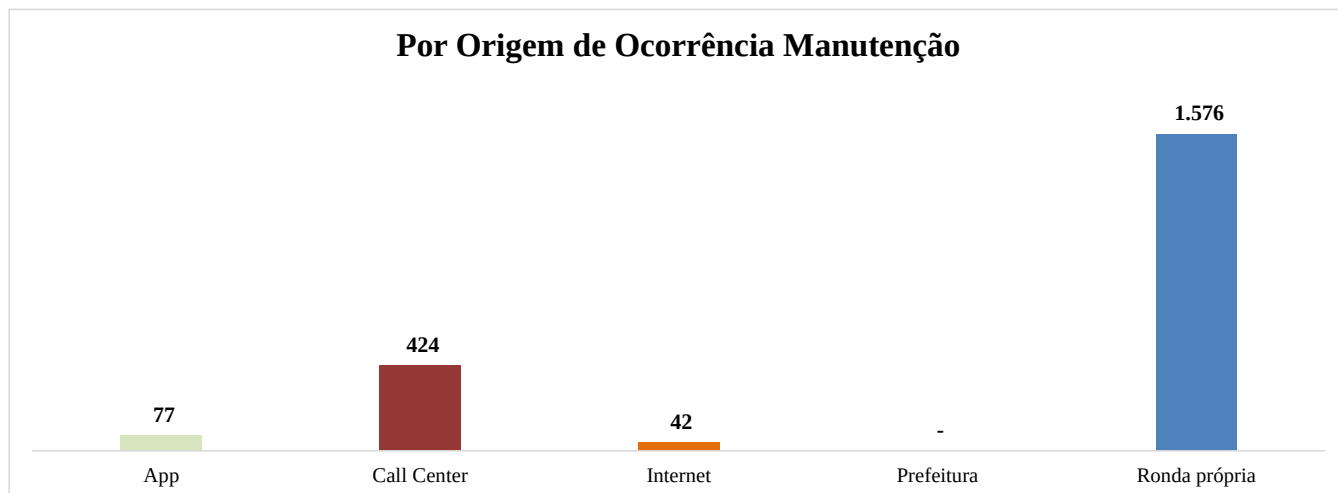


Tipo Ocorrência

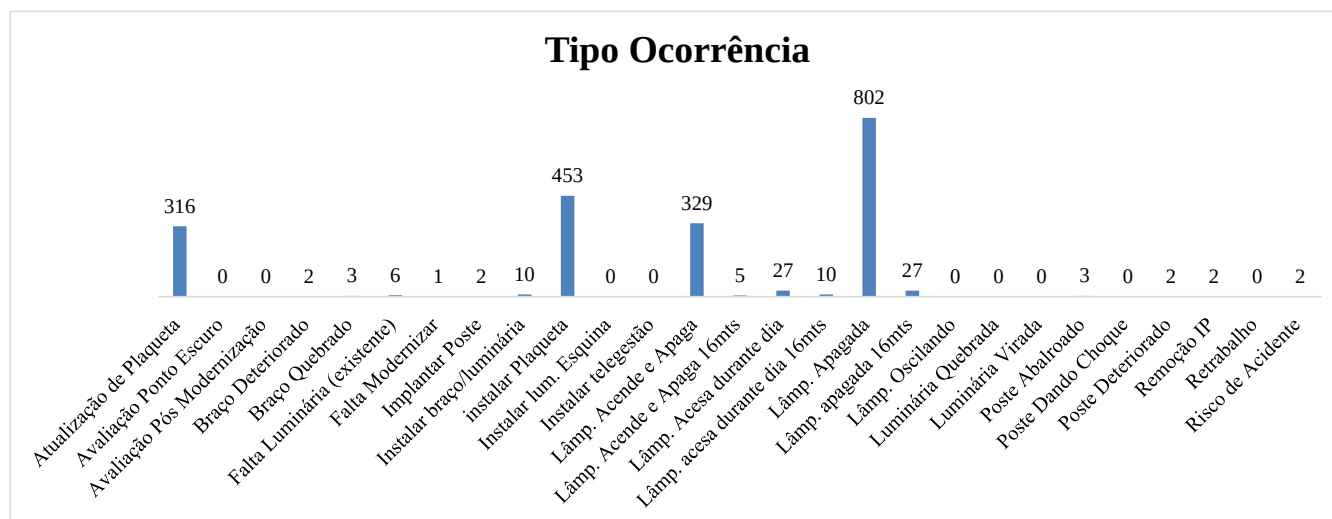




SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Atendimentos Por Equipe Manutenção

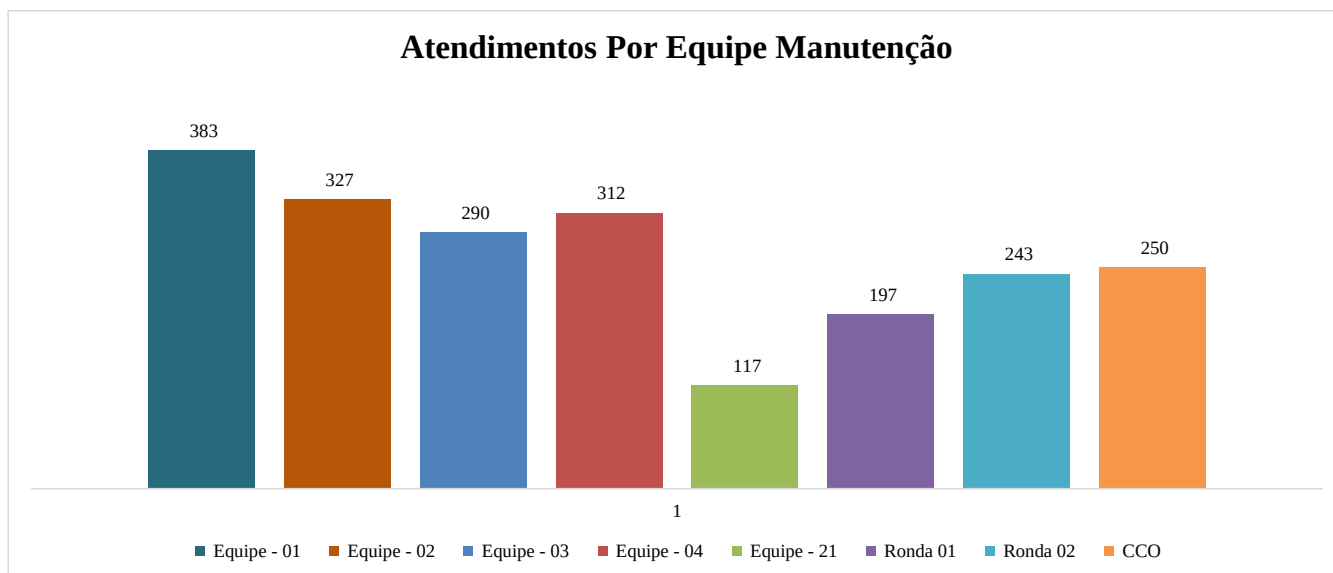


Prazo Manutenção

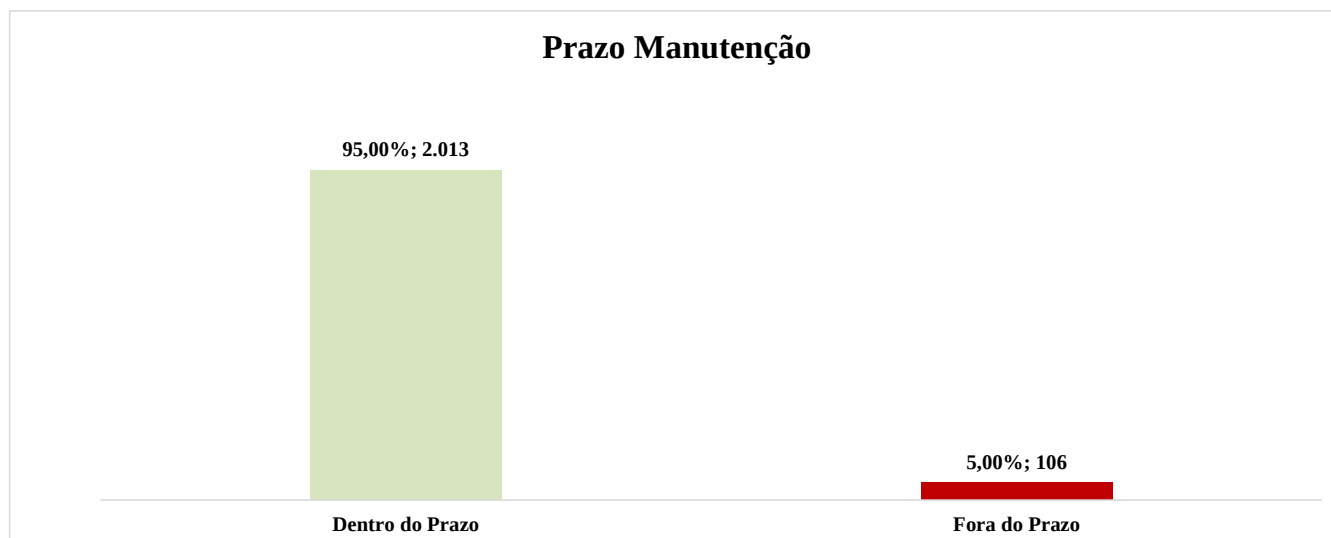



SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS - 2024

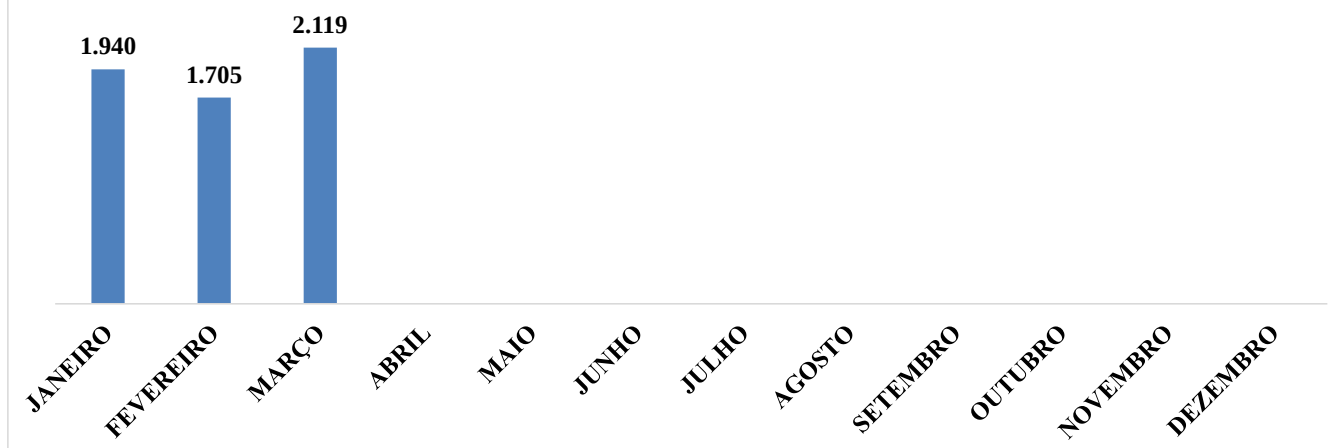

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

4. Estrutura operacional

4.1 Equipe manutenção

Eletricistas	8
Administrativo	1
Coordenador Operacional	1
Total	10

4.2 Equipe Obra

Eletricistas	1
Ajudante Eletricista	1
Pedreiro	1
Motorista	1
Total	4

4.3 Frota de veículos

Veículo leve	1
Veículo Cesto Aéreo	2
Motocicletas	2
Total	5

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

5. Modernização/ Iluminação especial/ Telegestão

5.1 Modernização

Item	Locais	QNT
1	13 DE JULHO	999
2	17 DE MARÇO	1306
3	18 DO FORTE	1380
4	AEROPORTO	1474
5	AMERICA	963
6	AREIA BRANCA	1036
7	ARUANA	3343
8	ATALAIA	2488
9	BUGIO	1171
10	CAPUCHO	562
11	CENTRO	2017
12	CIDADE NOVA	613
13	CIRURGIA	408
14	COROA DO MEIO	3375
15	DOM LUCIANO	627
16	FAROLÂNDIA	3116
17	GAMELEIRA	894
18	GETÚLIO VARGAS	622
19	GRAGERU	1323
20	INACIO BARBOSA	1856
21	INDUSTRIAL	1650
22	JABOTIANA	2080
23	JAPÃOZINHO	479
24	JARDIM CENTENÁRIO	644
25	JARDINS	1656
26	JOSE CONRADO DE ARAUJO	818
27	LAMARÃO	493
28	LUZIA	1552
29	MARIVAN	813
30	MATAÕA	805
31	MOSQUEIRO	1693
32	NOVO PARAISO	849
33	OLARIA	1024
34	PALESTINA	240
35	PEREIRA LOBO	412
36	PONTO NOVO	1303
37	PORTO DANTAS	1432
38	ROBALO	841
39	SALGADO FILHO	561
40	SANTA MARIA	2037
41	SANTO ANTÔNIO	963
42	SANTOS DUMONT	1476
43	SÃO CONRADO	1596
44	SÃO JOSÉ	904
45	SÃO JOSE DOS NAUFRAGOS	1270
46	SIQUEIRA CAMPOS	1145
47	SOLEDADE	938
48	SUISSA	819
TOTAL		60.066

Percentual de Modernização

100,000%



Percentual de Eficientização

Clinical	12.865.523,40
Cltotal	4.055.801,00

68,48%



SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

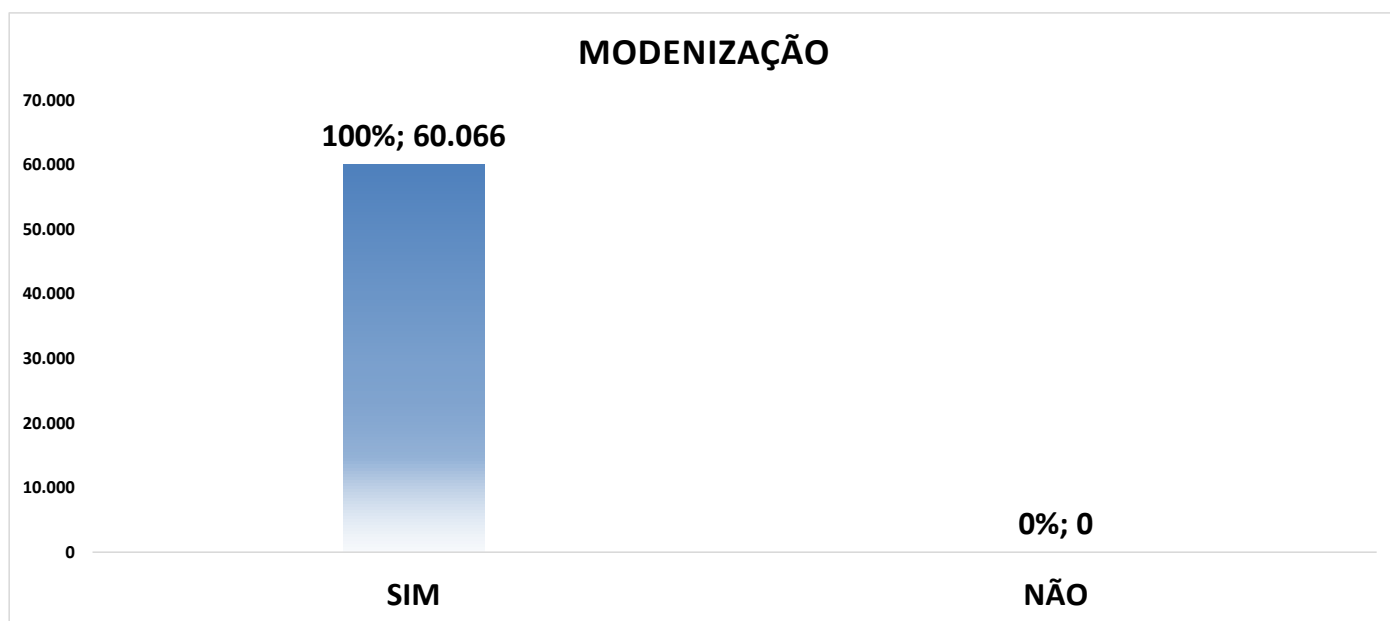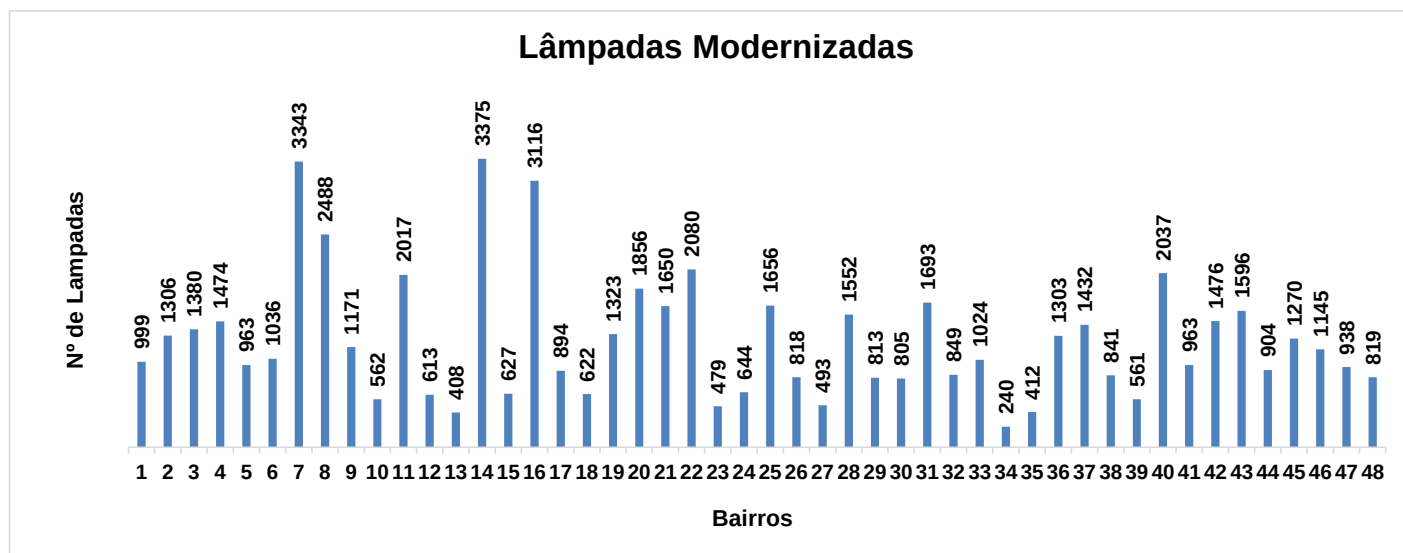

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

5.2 Iluminação especial

Referente a iluminação especial, foram elaborados todos os projetos executivos, referente ao marco I, II e III, modernizamos todos os pontos existentes referente aos projetos especiais:

Item	Local	Projeto	Moderniza ção	Execução Iluminação especial
MARCO I				
1	Colina do Santo Antonio	100%	100%	100%
2	Monumento Formadores da Nação	100%	100%	100%
3	Mundo Maravilhoso da Criança	100%	100%	100%
4	Oceanário	100%	100%	100%
5	Arco da Atalaia	100%	100%	100%
6	Centro Cultural	100%	100%	100%
MARCO II				
7	Igreja dos Capuchinhos	100%	100%	100%
8	Orlínha do Bairro Industrial	100%	100%	100%
9	Ponte do Imperador	100%	100%	100%
10	Ponte Godofredo Diniz	100%	100%	100%
11	Praça dos Mercados	100%	100%	100%
MARCO III				
12	Farol da Unit	100%	100%	0%
13	Catedral Metropolitana	100%	100%	80%




SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

5.3 Telegestão

Concluimos as cotações e escolha de tecnologia para conectividade entre as luminárias Led e o Software de Gerenciamento que usaremos para implantar a Telegestão, considerando as características da infraestrutura de Aracaju. Posteriormente apresentaremos o cronograma com os pontos que receberão a telegestão.

- Previsão de chegada dos materiais 10/08/2022;
- Treinamento de forma presencial (em Aracaju) entre os dias 08 e 10/08/2022;
- Previsão do início da instalação dos equipamentos logo após o treinamento;
- Previsão do término da instalação dos equipamentos 15/09/2022;
- Término da instalação dos equipamentos 31/08/2022;

Previsto (Marco I)	3.590	100%
Instalado	3.590	100%
Previsto (Marco II)	2.810	100%
Instalado	810	28,83%

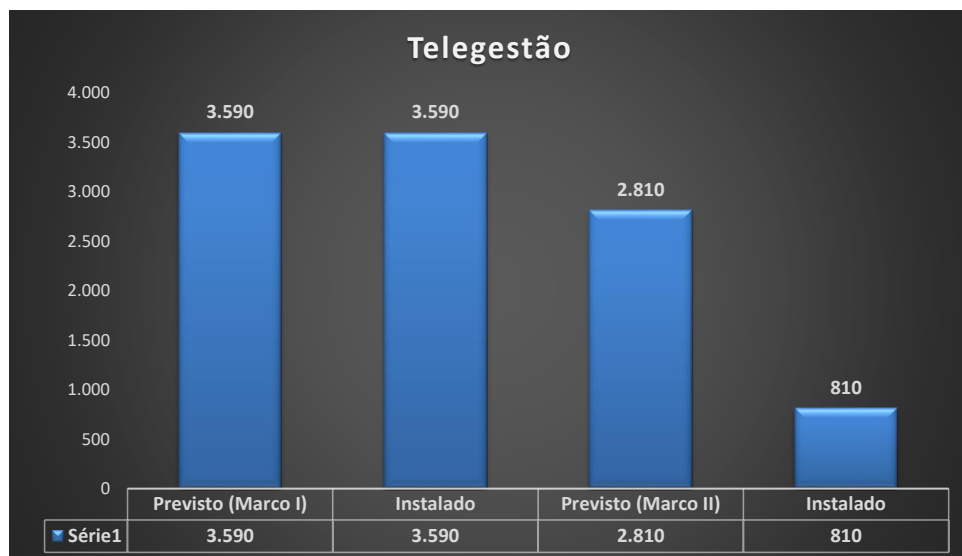

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

5.3 Banco de Crédito

	Íncio do	Período (t)	Saldo Anterior (Sat)	Créditos adicionado s no Périodo (CA _t)	Créditos consumidos no Período (CC _t)	Saldo para o próximo Período (SF _t)	Data
1	Início Fase II		0	739	739	0	09/11/2021
2	12 meses após período anterior		0	739	734,11	4,89	09/11/2022
3	12 meses após período anterior		4,89	739		743,89	09/11/2023

Obs.:As Informações foram extraídas do relatório full, e ainda estão em processo de análise.
