



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

CONTRATO DE CONCESSÃO

Concessionária
de Iluminação Pública

 **conecta**
Aracaju / SE

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relatório Gerencial Mensal Período: Julho/2024

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

INTRODUÇÃO

É com satisfação que apresentamos o relatório referente ao período de 01/07/2024 à 31/07/2024, que abrange os acontecimentos mais significativos do Centro de Controle Operacional (CCO). Este documento destaca os atendimentos realizados durante o período, fornecendo insights sobre o volume de demandas atendidas por equipe, os prazos de execução, bem como o número de ocorrências rejeitadas. Além disso, são detalhadas as composições das equipes técnicas envolvidas em atividades de manutenção e modernização, junto com os resultados obtidos, incluindo a quantidade de luminárias e lâmpadas modernizadas, os sistemas de iluminação especial implementados e o progresso alcançado na telegestão. Este relatório visa oferecer uma visão abrangente das operações realizadas pelo CCO, proporcionando uma base sólida para análises e tomadas de decisão futuras.

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

1 - ATENDIMENTOS MANUTENÇÃO

1.1 Status Atendimentos

Atendido	2.013
Total	2.013

1.2 Por origem de ocorrência

App	247
Call Center	853
Internet	50
Prefeitura	4
Ronda própria	859
Total	2.013

1.3 Tipo Ocorrência

Atualização de Plaqueta	154	7,65%
Avaliação Ponto Escuro	1	0,05%
Avaliação Pós Modernização	0	0,00%
Braço Deteriorado	1	0,05%
Braço Quebrado	2	0,10%
Falta Luminária (existente)	0	0,00%
Falta Modernizar	0	0,00%
Implantar Poste	0	0,00%
Instalar braço/luminária	9	0,45%
instalar Plaqueta	36	1,79%
Instalar lum. Esquina	0	0,00%
Instalar telegestão	0	0,00%
Lâmp. Acende e Apaga	358	17,78%
Lâmp. Acende e Apaga 16mts	22	1,09%
Lâmp. Acesa durante dia	37	1,84%
Lâmp. acesa durante dia 16mts	2	0,10%
Lâmp. apagada	1.309	65,03%
Lâmp. apagada 16mts	33	1,64%
Lâmp. Oscilando	0	0,00%
Luminária Quebrada	6	0,30%
Luminária Virada	7	0,35%
Poste Abalroado	0	0,00%
Poste Dando Choque	0	0,00%
Poste Deteriorado	1	0,05%
Remoção IP	7	0,35%
Retrabalho	1	0,05%
Risco de Acidente	1	0,05%
Substituir Quadro de Comando	0	0,00%
Troca de Potência	3	0,15%
Verificar Comando	4	0,20%
Vistoria	19	0,94%
Vistoria Telegestão	0	0,00%
Total	2.013	100%



SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

1.4 Por equipe

Equipe - 01	289
Equipe - 02	353
Equipe - 03	451
Equipe - 04	477
Equipe - 05	208
Ronda 01	58
Ronda 02	96
CCO	81
Total	2.013

1.5 Por prazo

Dentro do Prazo	1.877	93,24%
Fora do Prazo	136	6,76%
Total	2.013	100%



SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

2 - ATENDIMENTOS MODERNIZAÇÃO/SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.1 Status Atendimentos

Mod: Atendido	12
Total	12

2.2 Por equipe


Equipe - 01	-
Equipe - 02	10
Equipe - 03	-
Equipe - 04	2
Equipe - 21	-
Total	12




SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

3 - Gráficos

Por Origem de Ocorrência Manutenção

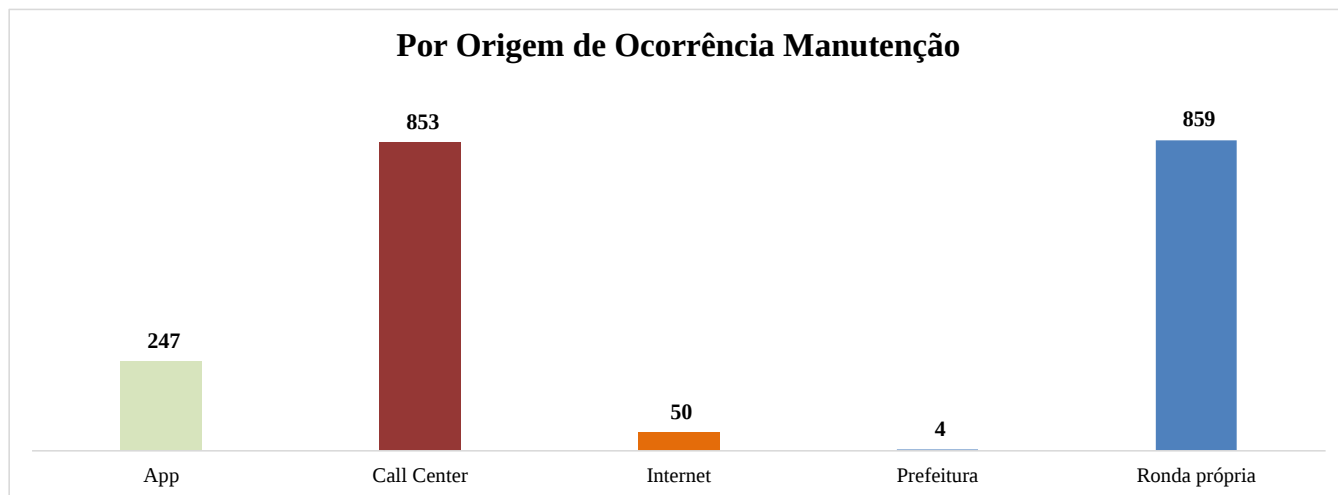


Tipo Ocorrência

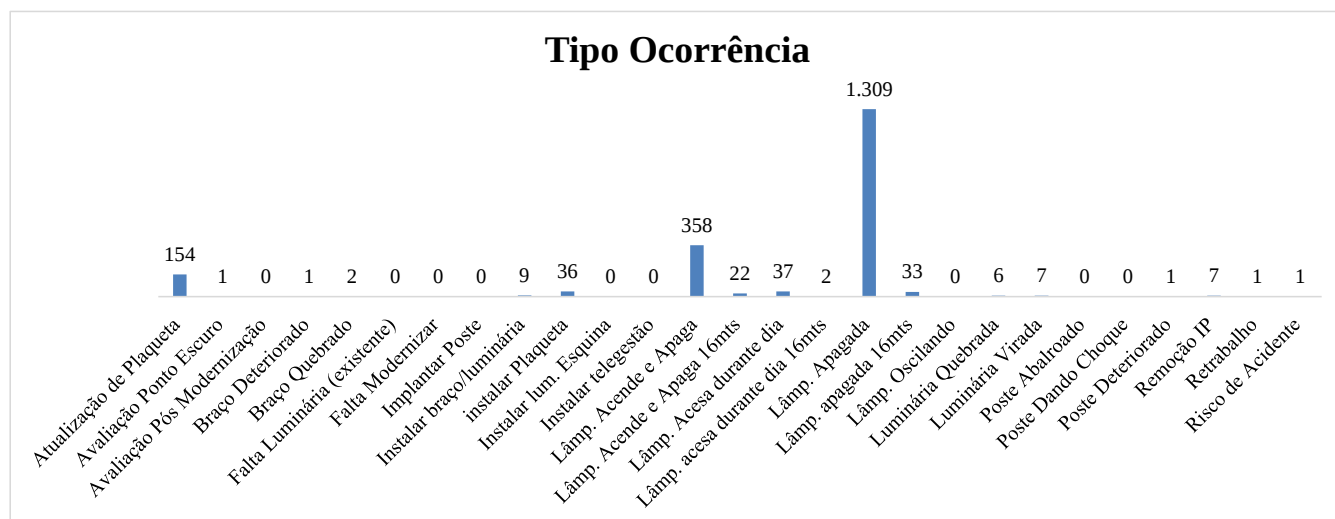




SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Atendimentos Por Equipe Manutenção

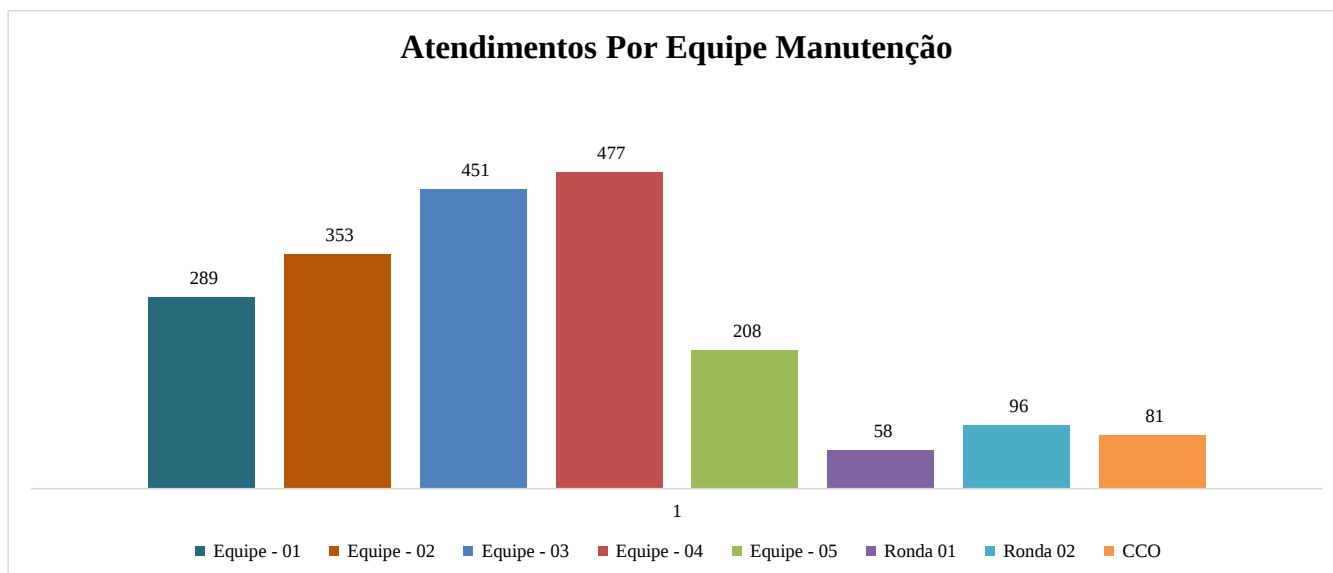


Prazo Manutenção

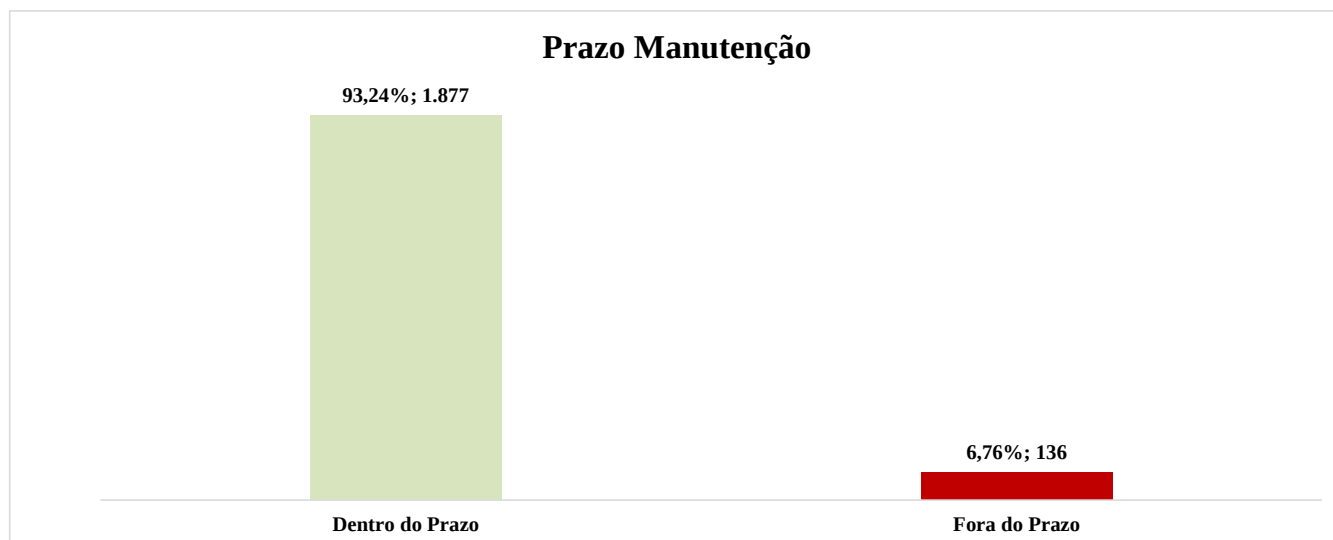



SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS - 2024

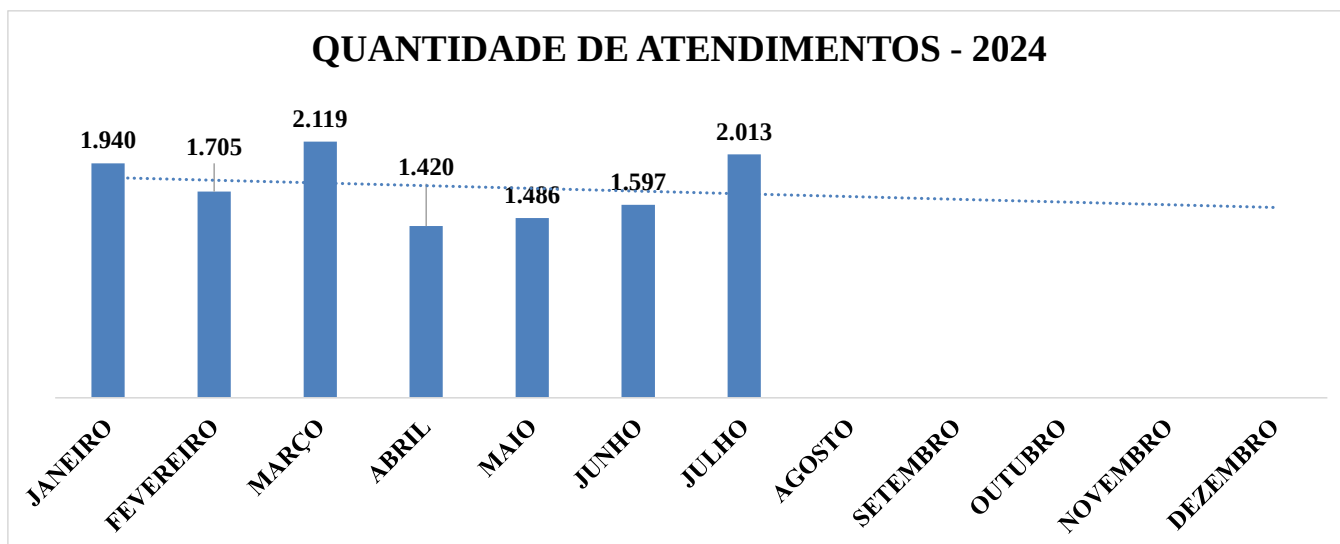

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

4. Estrutura operacional

4.1 Equipe manutenção

Eletricistas	8
Administrativo	1
Coordenador Operacional	1
Total	10

4.2 Equipe Obra

Eletricistas	1
Ajudante Eletricista	1
Pedreiro	1
Motorista	1
Total	4

4.3 Frota de veículos

Veículo leve	1
Veículo Cesto Aéreo	2
Motocicletas	2
Total	5

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

5. Modernização/ Iluminação especial/ Telegestão

5.1 Modernização

Item	Locais	QNT
1	13 DE JULHO	1004
2	17 DE MARÇO	1327
3	18 DO FORTE	1386
4	AEROPORTO	1474
5	AMERICA	975
6	AREIA BRANCA	1039
7	ARUANA	3350
8	ATALAIA	2480
9	BUGIO	1170
10	CAPUCHO	584
11	CENTRO	2026
12	CIDADE NOVA	615
13	CIRURGIA	408
14	COROA DO MEIO	3364
15	DOM LUCIANO	627
16	FAROLÂNDIA	3115
17	GAMELEIRA	896
18	GETÚLIO VARGAS	620
19	GRAGERU	1325
20	INACIO BARBOSA	1878
21	INDUSTRIAL	1653
22	JABOTIANA	2080
23	JAPÃOZINHO	479
24	JARDIM CENTENÁRIO	645
25	JARDINS	1661
26	JOSE CONRADO DE ARAUJO	818
27	LAMARÃO	489
28	LUZIA	1555
29	MARIVAN	819
30	MATAÔA	805
31	MOSQUEIRO	1695
32	NOVO PARAISO	849
33	OLARIA	1032
34	PALESTINA	240
35	PEREIRA LOBO	412
36	PONTO NOVO	1303
37	PORTO DANTAS	1430
38	ROBALO	843
39	SALGADO FILHO	561
40	SANTA MARIA	2038
41	SANTO ANTÔNIO	963
42	SANTOS DUMONT	1473
43	SÃO CONRADO	1597
44	SÃO JOSÉ	904
45	SÃO JOSE DOS NAUFRAGOS	1270
46	SIQUEIRA CAMPOS	1145
47	SOLEDADE	938
48	SUISSA	820
TOTAL		60.180

Percentual de Modernização

100,000%



Percentual de Eficientização

Clinical	12.865.523,40
Cltotal	4.062.816,00

68,42%



SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

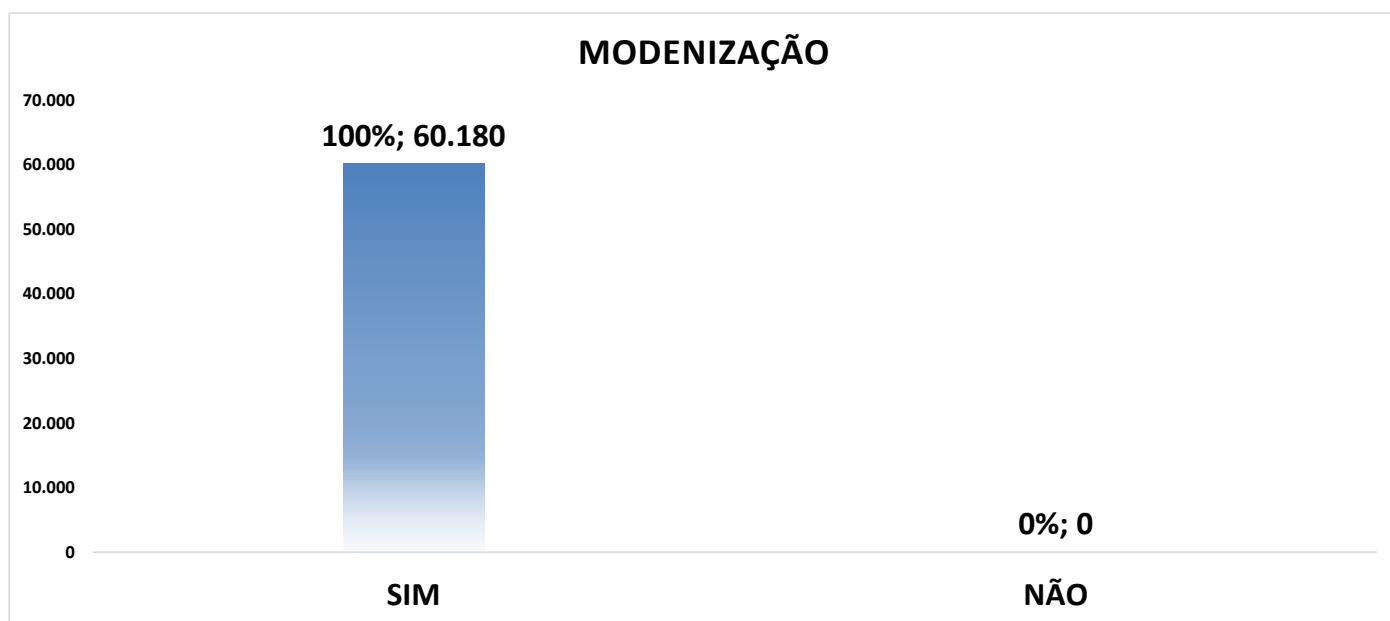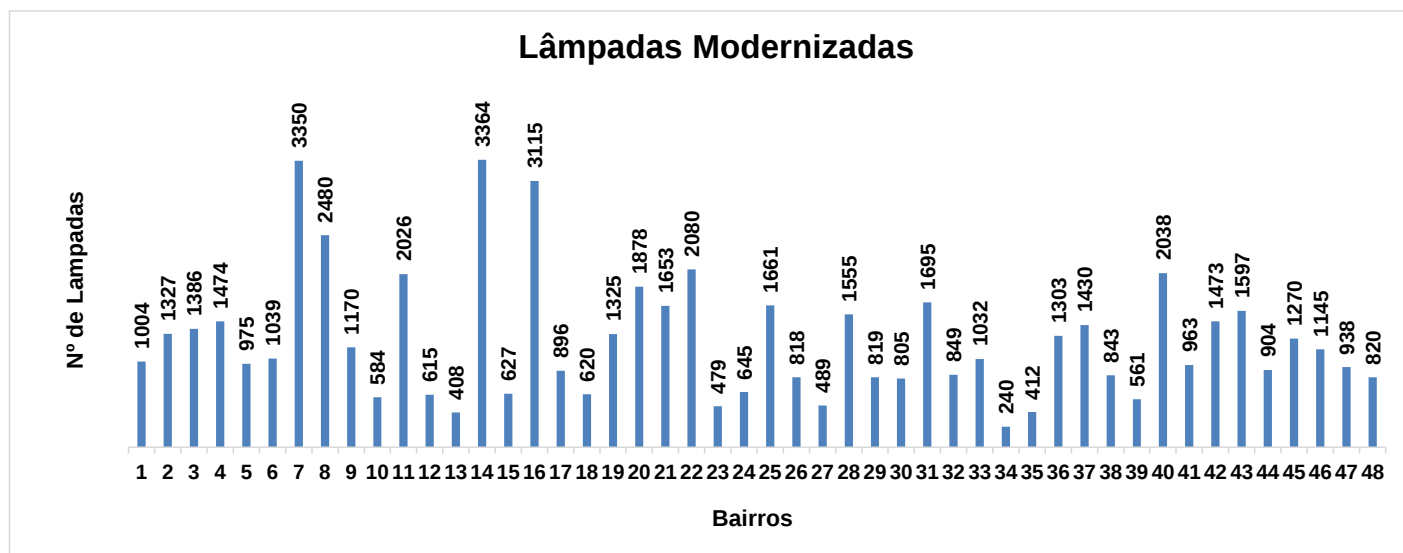

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

5.2 Iluminação especial

Referente a iluminação especial, foram elaborados todos os projetos executivos, referente ao marco I, II e III, modernizamos todos os pontos existentes referente aos projetos especiais:

Item	Local	Projeto	Moderniza ção	Execução Iluminação especial
MARCO I				
1	Colina do Santo Antonio	100%	100%	100%
2	Monumento Formadores da Nação	100%	100%	100%
3	Mundo Maravilhoso da Criança	100%	100%	100%
4	Oceanário	100%	100%	100%
5	Arco da Atalaia	100%	100%	100%
6	Centro Cultural	100%	100%	100%
MARCO II				
7	Igreja dos Capuchinhos	100%	100%	100%
8	Orlinda do Bairro Industrial	100%	100%	100%
9	Ponte do Imperador	100%	100%	100%
10	Ponte Godofredo Diniz	100%	100%	100%
11	Praça dos Mercados	100%	100%	100%
MARCO III				
12	Farol da Unit	100%	100%	0%
13	Catedral Metropolitana	100%	100%	100%


SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

5.3 Telegestão

Concluimos as cotações e escolha de tecnologia para conectividade entre as luminárias Led e o Software de Gerenciamento que usaremos para implantar a Telegestão, considerando as características da infraestrutura de Aracaju. Posteriormente apresentaremos o cronograma com os pontos que receberão a telegestão.

- Previsão de chegada dos materiais 10/08/2022;
- Treinamento de forma presencial (em Aracaju) entre os dias 08 e 10/08/2022;
- Previsão do início da instalação dos equipamentos logo após o treinamento;
- Previsão do término da instalação dos equipamentos 15/09/2022;
- Término da instalação dos equipamentos 31/08/2022;

Previsto (Marco I)	3.590	100%
Instalado	3.590	100%
Previsto (Marco II)	2.810	100%
Instalado	810	28,83%

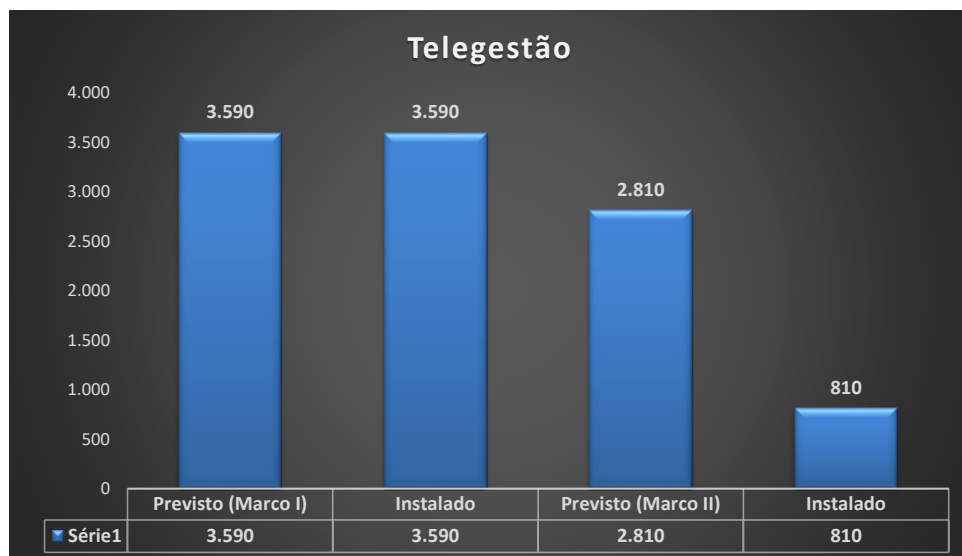

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

5.3 Banco de Crédito

	Ínicio do	Período (t)	Saldo Anterior (Sat)	Créditos adicionado s no Período (CA _t)	Créditos consumidos no Período (CC _t)	Saldo para o próximo Período (SF _t)	Data
1	Início Fase II		0	739	739	0	09/11/2021
2	12 meses após período anterior		0	739	739	0	09/11/2022
3	12 meses após período anterior		0	739	68,18	670,82	09/11/2023

Obs.:As Informações foram extraídas do relatório full, e ainda estão em processo de análise.
