



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

CONTRATO DE CONCESSÃO

Concessionária
de Iluminação Pública



conecta
Aracaju / SE

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relatório Gerencial Mensal Período: Janeiro/2024



SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

INTRODUÇÃO

O presente relatório, referente ao período de 01/01/2024 à 31/01/2024, reúne os principais fatos das atividades ocorridas no Centro de Controle Operacional, destacando os atendimentos realizados no período, os números de atendimentos realizados, por equipe, por prazo, numero de rejeições de ocorrências, formação das equipes técnicas de manutenção/modernização, quantidade de luminárias modernizadas, lâmpadas modernizadas, iluminação especial e telegestão.



SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

1 - ATENDIMENTOS MANUTENÇÃO

1.1 Status Atendimentos

Atendido	1.940
Total	1.940

1.2 Por origem de ocorrência

App	43
Call Center	327
Internet	28
Prefeitura	-
Ronda própria	1.542
Total	1.940

1.3 Tipo Ocorrência

Atualização de Plaqueta	566	29,18%
Avaliação Ponto Escuro	1	0,05%
Avaliação Pós Modernização	0	0,00%
Braço Deteriorado	9	0,46%
Braço Quebrado	0	0,00%
Falta Luminária (existente)	1	0,05%
Falta Modernizar	3	0,15%
Implantar Poste	0	0,00%
Instalar braço/luminária	3	0,15%
instalar Plaqueta	132	6,80%
Instalar lum. Esquina	0	0,00%
Instalar telegestão	0	0,00%
Lâmp. Acende e Apaga	202	10,41%
Lâmp. Acende e Apaga 16mts	2	0,10%
Lâmp. Acesa durante dia	11	0,57%
Lâmp. acesa durante dia 16mts	1	0,05%
Lâmp. Apagada	801	41,29%
Lâmp. apagada 16mts	23	1,19%
Lâmp. Oscilando	0	0,00%
Luminária Quebrada	0	0,00%
Luminária Virada	2	0,10%
Poste Abalroado	3	0,15%
Poste Dando Choque	0	0,00%
Poste Deteriorado	0	0,00%
Remoção IP	1	0,05%
Retrabalho	2	0,10%
Risco de Acidente	1	0,05%
Substituir Quadro de Comando	1	0,05%
Troca de Potência	0	0,00%
Vistoria	31	1,60%
Impossibilidades	144	7,42%
Total	1.940	100%



SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

1.4 Por equipe

Equipe - 01	425
Equipe - 02	308
Equipe - 03	272
Equipe - 04	234
Equipe - 21	63
Ronda 01	367
Ronda 02	252
CCO	19
Total	1.940

1.5 Por prazo

Dentro do Prazo	1.840	94,85%
Fora do Prazo	100	5,15%
Total	1.940	100%



SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

2 - ATENDIMENTOS MODERNIZAÇÃO/SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.1 Status Atendimentos

Mod: Atendido	12
Total	12

2.2 Por equipe


Equipe - 01	-
Equipe - 02	3
Equipe - 03	9
Equipe - 04	-
Equipe - 21	-
Total	12




SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

3 - Gráficos

Por Origem de Ocorrência Manutenção

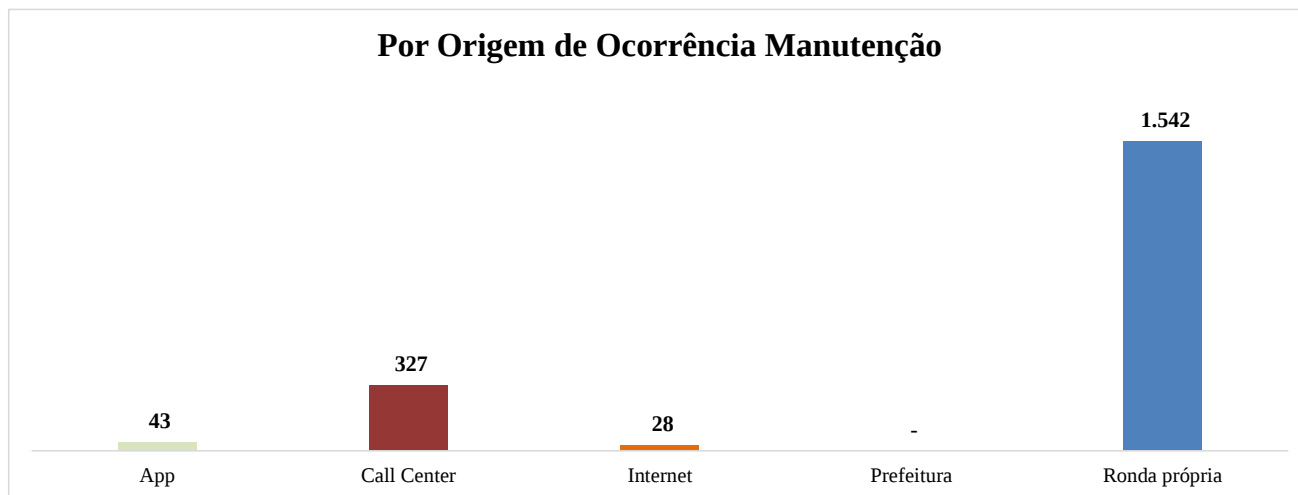


Tipo Ocorrência

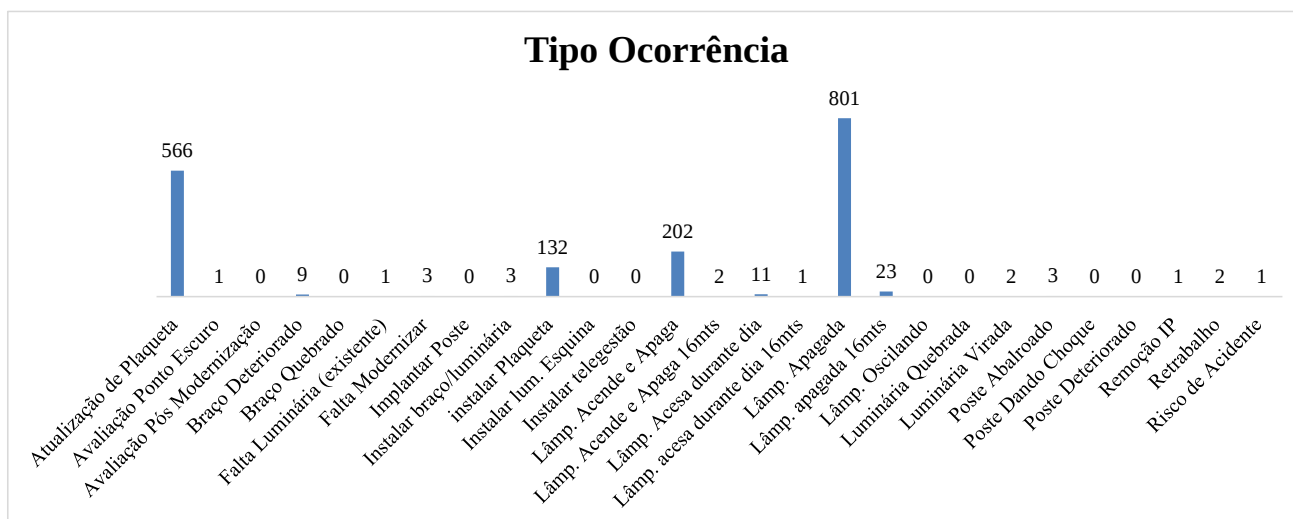




SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Atendimentos Por Equipe Manutenção

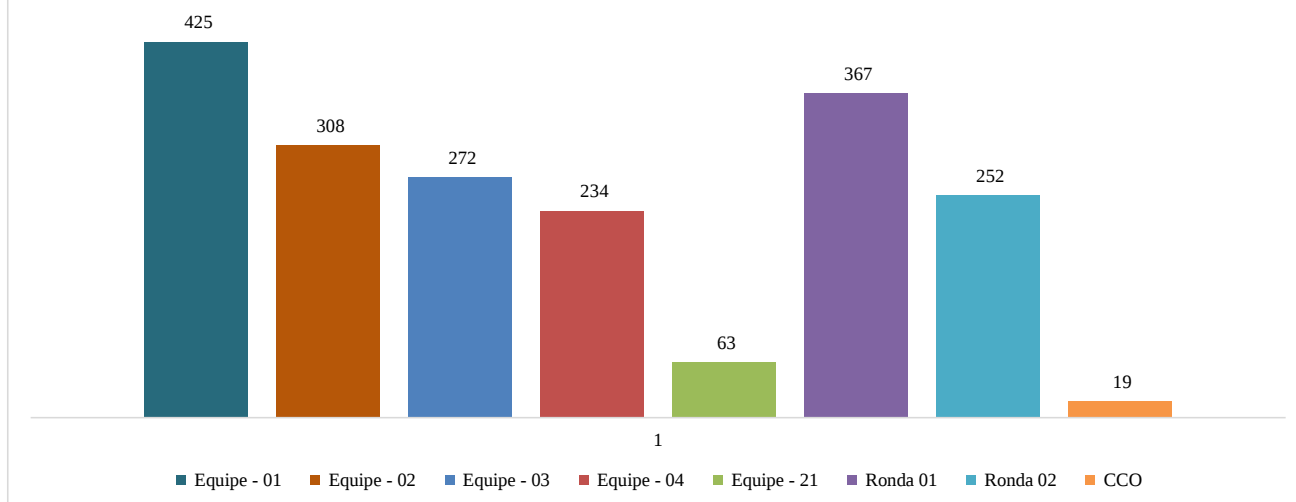

Prazo Manutenção

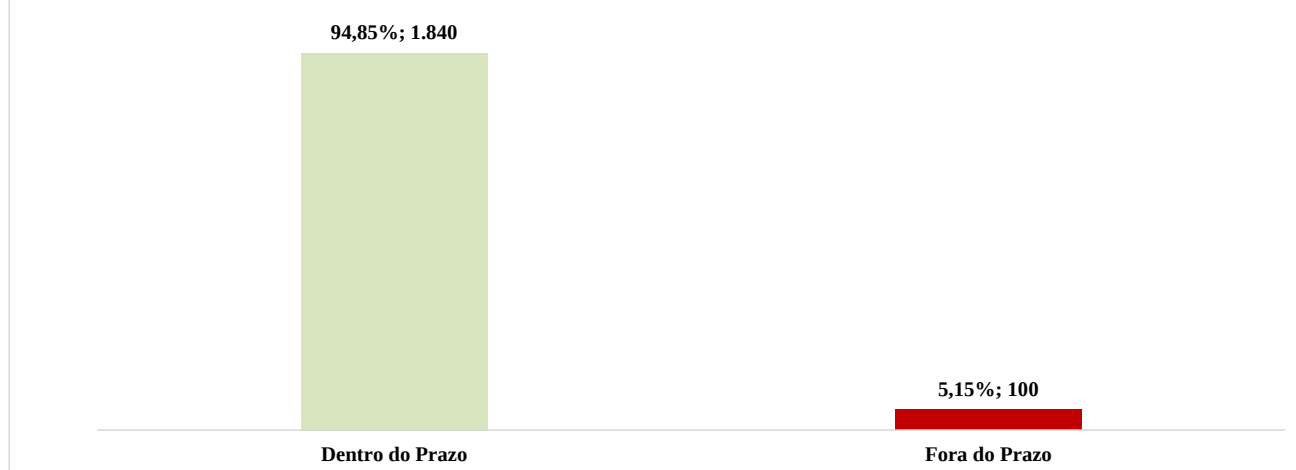



SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

4. Estrutura operacional

4.1 Equipe manutenção

Eletricistas	8
Administrativo	1
Coordenador Operacional	1
Total	10

4.2 Equipe Obra

Eletricistas	1
Ajudante Eletricista	1
Pedreiro	1
Motorista	1
Total	4

4.3 Frota de veículos

Veículo leve	1
Veículo Cesto Aéreo	2
Motocicletas	2
Total	5



SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

5. Modernização/ Iluminação especial/ Telegestão

5.1 Modernização

Item	Locais	QNT
1	13 DE JULHO	999
2	17 DE MARÇO	1310
3	18 DO FORTE	1380
4	AEROPORTO	1474
5	AMERICA	963
6	AREIA BRANCA	1036
7	ARUANA	3344
8	ATALAIA	2492
9	BUGIO	1172
10	CAPUCHO	562
11	CENTRO	2016
12	CIDADE NOVA	613
13	CIRURGIA	408
14	COROA DO MEIO	3373
15	DOM LUCIANO	624
16	FAROLÂNDIA	3115
17	GAMELEIRA	896
18	GETÚLIO VARGAS	622
19	GRAGERU	1323
20	INACIO BARBOSA	1856
21	INDUSTRIAL	1650
22	JABOTIANA	2074
23	JAPÃOZINHO	477
24	JARDIM CENTENÁRIO	644
25	JARDINS	1656
26	JOSE CONRADO DE ARAUJO	818
27	LAMARÃO	492
28	LUZIA	1551
29	MARIVAN	813
30	MATAÔA	805
31	MOSQUEIRO	1692
32	NOVO PARAISO	849
33	OLARIA	1025
34	PALESTINA	240
35	PEREIRA LOBO	413
36	PONTO NOVO	1303
37	PORTO DANTAS	1432
38	ROBALO	842
39	SALGADO FILHO	562
40	SANTA MARIA	2033
41	SANTO ANTÔNIO	961
42	SANTOS DUMONT	1472
43	SÃO CONRADO	1592
44	SÃO JOSÉ	904
45	SÃO JOSE DOS NAUFRAGOS	1272
46	SIQUEIRA CAMPOS	1145
47	SOLEDADE	939
48	SUISSA	819
TOTAL		60.053

Percentual de Modernização

100,000%

Percentual de Eficientização


Clinicial 12.865.523,40

Cltotal 3.675.182,00

71,43%



SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

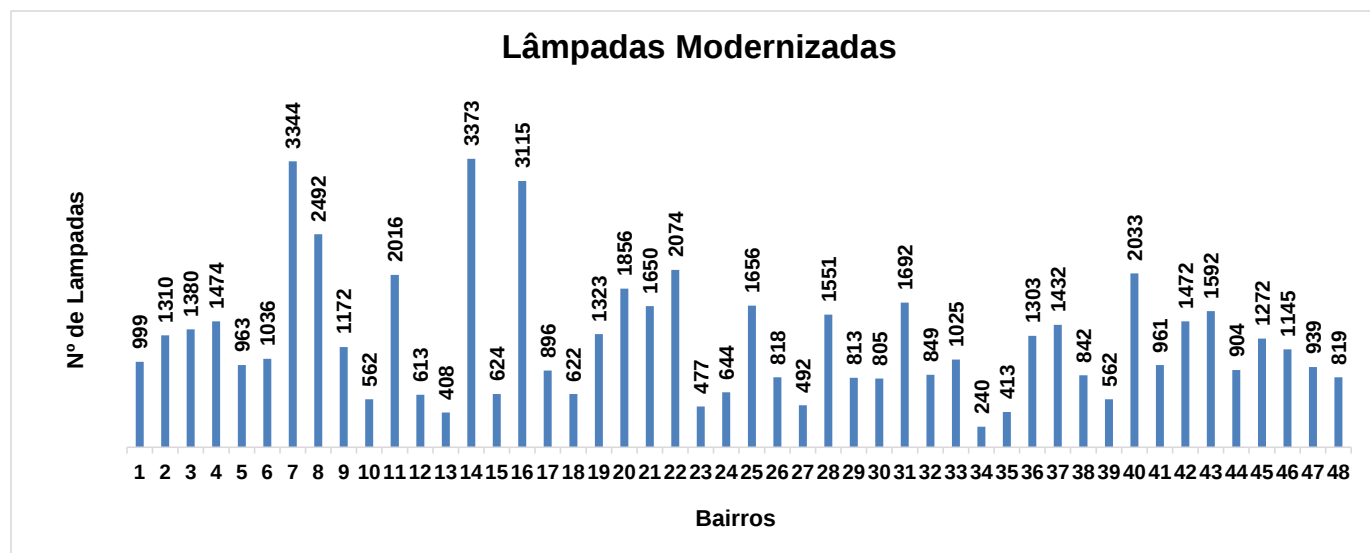

5.2 Iluminação especial

Referente a iluminação especial, foram elaborados todos os projetos executivos, referente ao marco I e II, modernizamos todos os pontos existentes referente aos projetos especiais:

Item	Local	Projeto	Moderniza ção	Execução Iluminação especial
MARCO I				
1	Colina do Santo Antonio	100%	100%	100%
2	Monumento Formadores da Nação	100%	100%	100%
3	Mundo Maravilhoso da Criança	100%	100%	100%
4	Oceanário	100%	100%	100%
5	Arco da Atalaia	100%	100%	100%
6	Centro Cultural	100%	100%	100%
MARCO II				
7	Igreja dos Capuchinhos	100%	100%	100%
8	Orlinha do Bairro Industrial	100%	100%	100%
9	Ponte do Imperador	100%	100%	100%
10	Ponte Godofredo Diniz	100%	100%	100%
11	Praça dos Mercados	100%	100%	100%
MARCO III				
12	Farol da Unit	100%	100%	0%
13	Catedral Metropolitana	100%	100%	20%



SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

5.3 Telegestão

Concluimos as cotações e escolha de tecnologia para conectividade entre as luminárias Led e o Software de Gerenciamento que usaremos para implantar a Telegestão, considerando as características da infraestrutura de Aracaju. Posteriormente apresentaremos o cronograma com os pontos que receberão a telegestão.

- Previsão de chegada dos materiais 10/08/2022;
- Treinamento de forma presencial (em Aracaju) entre os dias 08 e 10/08/2022;
- Previsão do início da instalação dos equipamentos logo após o treinamento;
- Previsão do término da instalação dos equipamentos 15/09/2022;
- Término da instalação dos equipamentos 31/08/2022;

Previsto (Marco I)	3.590	100%
Instalado	3.644	102%
Previsto (Marco II)	2.810	100%
Instalado	756	27%

